



№ 42-01/20

“29” იანვარი 2020 წ.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს გენერალურ დირექტორს
ბატონ ნიკოლოზ ანთიძეს

ასლი: კულტურული მემკვიდრეობის
ინსპექციის უფროსს
ბატონ ლევან ჭავჭავაძეს

ბატონო ნიკოლოზ,

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული
N: IBRD/AF/CW/NCB/05-2018 ხელშეკრულებისა და თქვენს მიერ 2019 წლის 11 სექტემბერს
გაცემული N: 5/12/209 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების წარმოების
სანებართვო მოწმობის საფუძველზე ვაწარმოებთ ტყიბულის მუნიციპალიტეტი - გელათის
სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზის და საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის
სამუშაოებს.

აღნიშნულ პროექტში, სამუშაოების წარმოებისას გამოვლენილი ობიექტური
გარემოებების გამო მიმდინარეობს ცვლილებების შეტანა, რაც სავარაუდოდ გამოიწვევს
სამუშაოების წარმოების ვადების გახანგრძლივებას. შესაბამისად წარმოგიდგინებ
საანგარიშო პერიოდში ჩვენს მიერ პროექტის ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოთა
შუალედურ ანგარიშს 2020 წლის 20 იანვრის მდგომარეობით.


დანართები:

- შუალედური ანგარიშის მყარი ვერსია 2 ეგზემპლარად აკინძული ალბომის სახით;
- სამუშაოთა ანგარიშის ელექტრონული ვერსია CD დისკზე;

პატივისცემით,
დირექტორი:




/ გიორგი ჯავახაძე /

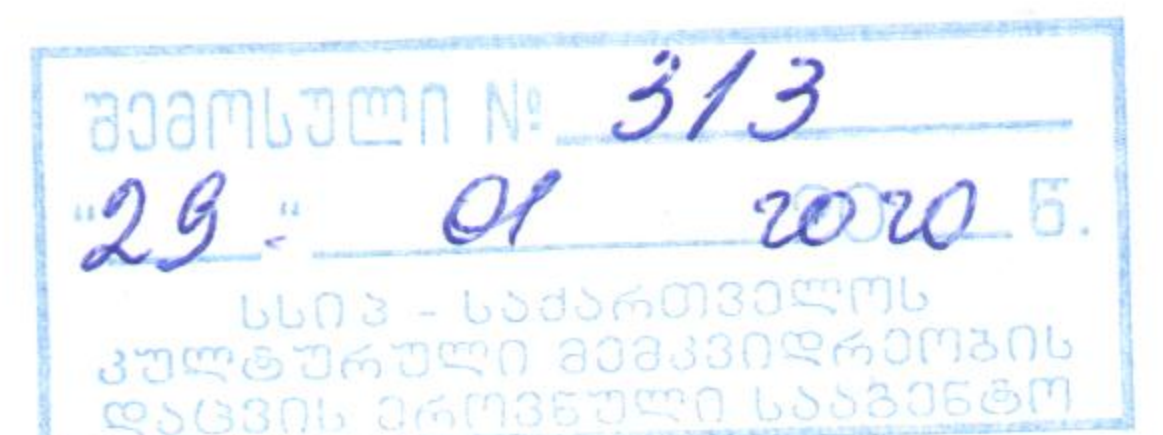

დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი

დონორი: მსოფლიო ბანკი

შემსრულებელი: შ.პ.ს. „ჯავა“

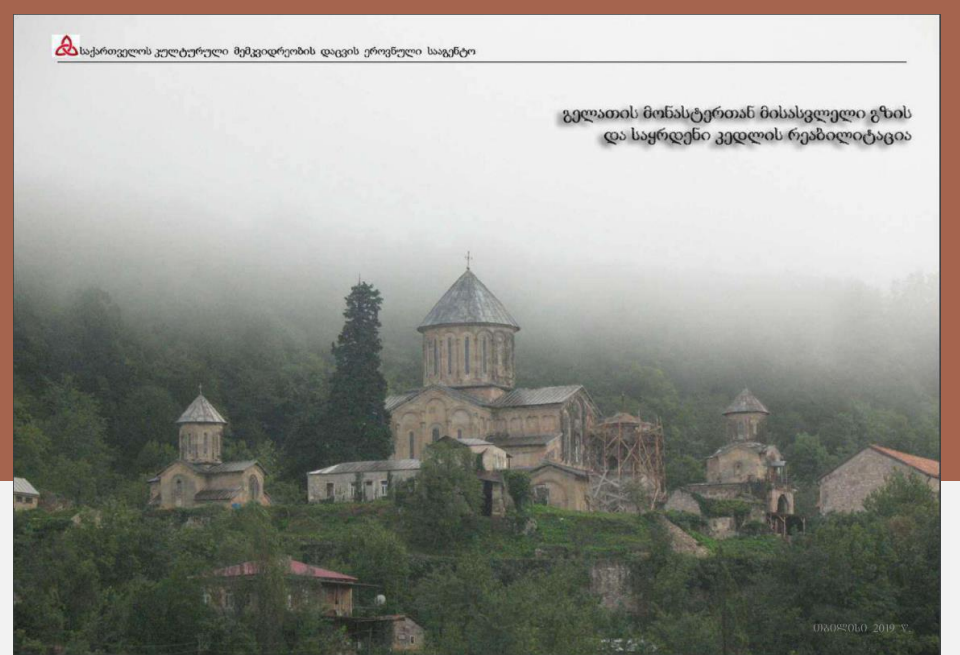

გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის და
საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია

შ უ ა ლ ე დ უ რ ი ა ნ გ ა რ ი შ ი №1

20 იანვრის 2020 წელი

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული N: IBRD/AF/CW/NCB/05-2018 ხელშეკრულებისა და თქვენს მიერ 2019 წლის 11 სექტემბერს გაცემული N: 5/12/209 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების წარმოების სანებართვო მოწმობის საფუძველზე ვაწარმოებთ ტყიბულის მუნიციპალიტეტი - გელათის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზის და საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის სამუშაოებს. აღნიშნულ პროექტში, სამუშაოების წარმოებისას გამოვლენილი ობიექტური გარემოებების გამო მიმდინარეობს ცვლილებების შეტანა, რაც სავარაუდოდ გამოიწვევს სამუშაოების წარმოების ვადების გახანგრძლივებას. შესაბამისად წარმოგიდგენთ საანგარიშო პერიოდში ჩვენს მიერ პროექტის ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოთა შუალედურ ანგარიშს 2020 წლის 20 იანვრის მდგომარეობით.

	სამშენებლო სამუშაოები Construction Works	
	კონსტრუქციული ნაწილი Structural part	
1	III კატეგორიის გრუნტის მოჭრა შებრუნებულციცხვიანი ექსკავატორით Processing III category soil with excavator	89.23%
2	გრუნტის დამუშავება ხელით, არქეოლოგის ზედამხედველობით Processing the soil manually, with supervision of archeologist	13.61%
5	მონოლითური რკ/ბეტონის ბურღვანატენი ხიმინჯების მოწყობა Arrangement of monolithic reinforcement piles	36.30%
21	დროებითი საყრდენი კედლის ზედა რიგის დემონტაჟი და მიმდებარე ბაქანზე მოწყობილ ბალასტის მომზადებაზე გადატანა Dismantling the upper row of the temporarily retaining wall and removing on the balast layer arranged on the platform	100.00%
26	ბალასტის უკუჩაყრა და ჩატკეპნა Backfilling the balast and compaction	60.00%

